


影响范围	所在区域	影响桩位数
武警部队驻地	C0-1、C2	194根
横泾港河道	B1、B2、B3、B4、B6、C3、C4	660根
民房及苗圃	A3、A6	151根
周家浜	A0-1、A2	21根

说明:

- 1、西航站楼共分A0-A6区,B1-B6区以及C0-C6区。其中主楼为B1、B3、B5区,其余区均为长廊。
- 2、安排4个800KVA的箱变。一级电箱沿桩区每百米布置一个。
- 3、在桩区内布置临时施工便道,与现有道路接通,作为设备及桩的运输道路。
- 4、在临时施工便道两边布置宽60cm,深30cm的排水沟,接通桩区外的排水系统。

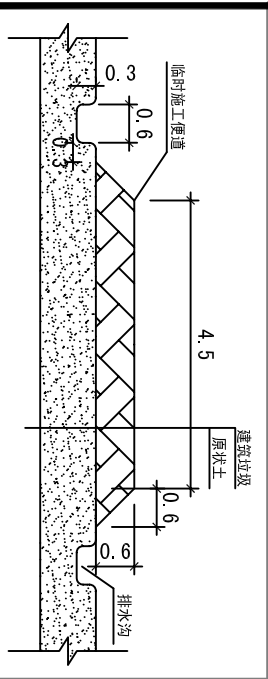

临时施工便道及排水沟示意图

工程名称	上海虹桥综合交通枢纽工程
图 名	西航站楼桩基施工平面布置图
图 号	附图01
